


Sanierung der Ortsdurchfahrt - Beginn in der Schillerstraße / Rathausstraße

In dieser Woche haben die Bauarbeiten mit dem ersten Bauabschnitt (rot straffiert) in der Schillerstraße / Rathausstraße begonnen. Der Parkplatz gegenüber dem Alten Schulhaus kann daher nicht mehr genutzt werden.

Bauabschnitte

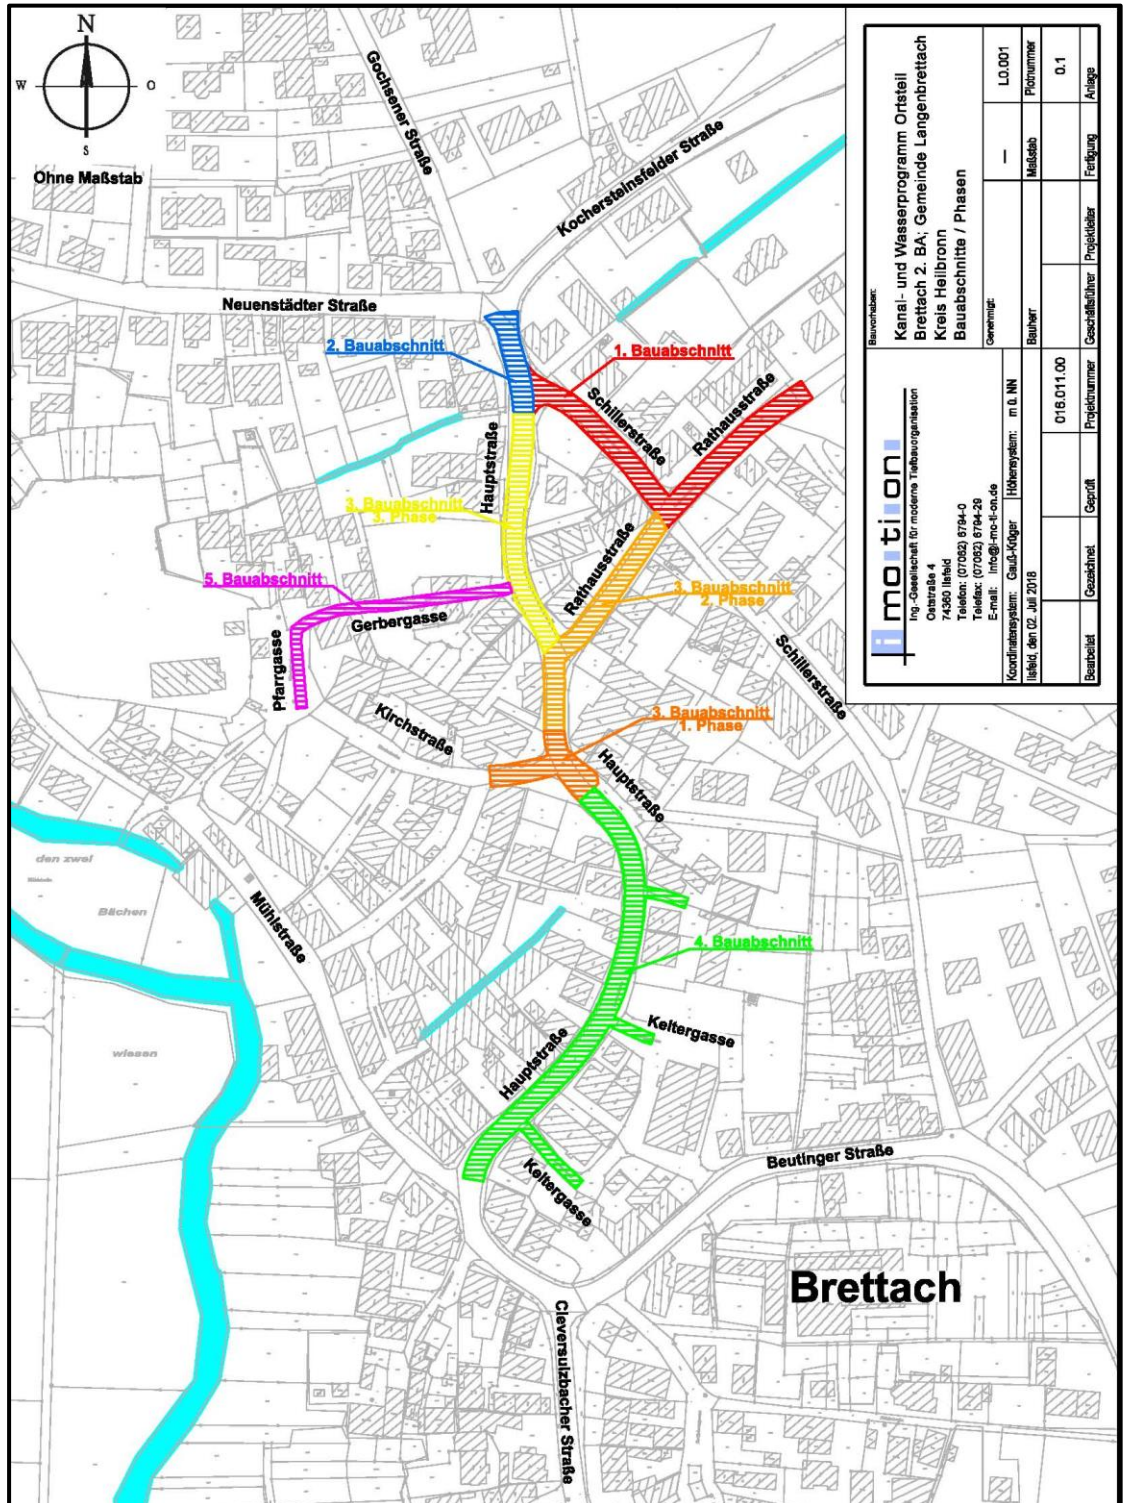

Voraussichtlicher Zeitplan

Bauabschnitt	Bauzeit	Beginn	Ende
1. Bauabschnitt	12 Wochen	Ende Januar 2019	Mitte/Ende April 2019
2. Bauabschnitt	4 Wochen	Mitte/Ende April 2019	Mitte Mai 2019
3. Bauabschnitt <i>1. Teilabschnitt</i>	5 Wochen	Mitte Mai 2019	Ende Juni 2019
3. Bauabschnitt <i>2. Teilabschnitt</i>	6 Wochen	Anfang Juli 2019	Anfang/ Mitte August 2019
3. Bauabschnitt <i>3. Teilabschnitt</i>	6 Wochen	Anfang/ Mitte August 2019	Mitte September 2019
4. Bauabschnitt	16 Wochen	Mitte/Ende September 2019	Ende Februar 2020
5. Bauabschnitt	4 Wochen	Anfang März 2020	Ende März 2020
Restarbeiten	4 Wochen	Anfang April 2020	Ende April 2020

**Dieser Zeitplan kann sich natürlich noch verschieben. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und bitten heute schon um Ihr Verständnis.
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.**
